

# Faktúra

**Dodávateľ**



IČ DPH SK2020025227  
IČO 36473332  
DIČ 2020025227

**Číslo** 13280008  
Konšt. symbol 308  
Zmluva-obj. číslo  
Stredisko 802182

Chemkostav HSV akciová spol.  
Štefánikova 18  
066 01 Humenné

**Účet:** 3019153700 **BIC:**  
Všeobecná úverová banka, a.s., Humenné  
OR OS Prešov Sp.zn. č. Sa 10220/P

**Prijemca**

MESTO HUMENNE  
KUKORELLIHO 34  
066 01 Humenné

**Odberateľ** IČO 00323021 IČ DPH Humenné  
DIČ 2021232598

04-05-2011

**MESTO HUMENNE**

**KUKORELLIHO 34**

066 01 Humenné

sekretariát primátorky

MESTO HUMENNE  
MESTSKÝ ÚRAD

04-05-2011

č.j. 426/2011 Pril. 5x

**Dodacie podmienky**  
**Spôsob dopravy**

**Forma úhrady** Prevodný príkaz

**Dátum vystavenia** 2.5.2011  
**Dátum splatnosti** 3.8.2011  
**Dátum vz.dan.pov.** 28.4.2011

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena % DPH bez DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	-------------	------------------------	--------------	------------

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 19. 10. 2010 fakturujeme Vám stavebné práce vykonané na stavbe Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom za obdobie od 10. 3. 2011 do 28. 4. 2011

SO 01 Hala	1,000	328 417,51 20%	328 417,51	394 101,01
SO 02 Administratívna budova	1,000	5 911,79 20%	5 911,79	7 094,15
SO 03 Mostová váha	1,000	11 218,44 20%	11 218,44	13 462,13
SO 04 Spevnené plochy a manipulačné plochy	1,000	14 046,48 20%	14 046,48	16 855,78
SO 09 Oplotenie	1,000	4 005,34 20%	4 005,34	4 806,41

**SPOLU BEZ DPH:** 363 599,56

**SUMA NA ÚHRADU: €** 436 319,47

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK

13 144 560,35

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	363599,56	72719,91	436319,47
<b>Spolu</b>	<b>363599,56</b>	<b>72719,91</b>	<b>436319,47</b>

**Vyhotovil:** Katarina Valková

tel.: 057 / 77 22 33 9

fax.: 057 / 77 22 33 5

email: valkova@chemkostav.sk

Chemkostav HSV akciová spol.

Štefánikova 18

066 01 Humenné

CHEMKOSTAV HSV  
akciová spoločnosť  
Humenné

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Počet príloh: .....

**ZHOTOVITEĽ**

Chemkostav HSV akciová spoločnosť  
sídlo: Štefánikova 18, 066 01 Humenné

IČO: 36 473 332  
IČ DPH: 202 002 5227

**OBJEDNÁVATEĽ**

Mesto Humenné, Mestský úrad  
sídlo: Kukoreliho 34, 066 01 Humenné

IČO: 323021  
IČ DPH:

Stavba: **Separčný dvor na Sninskej ulici v Humennom**  
Miesto: Humenné

**Údaje v EUR**

1. Celkový náklad z rozpočtu:				1 638 055,57
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	327 775,30	363 599,56	691 374,86	
3. DPH	65 555,06	20,00 % 72 719,91	138 274,97	
4. Celkom	393 330,36	436 319,47	829 649,83	

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**Chemkostav HSV**  
akciová spoločnosť  
Humenné

V Humennom



Dátum: 29.4.2011.



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Názov stavby

Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

JKSO

EČO

Miesto

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Projektant

WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov

Zhotoviteľ

Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Rozpočet číslo

Spracoval


Dňa

Zdena Čelovská

29.04.2011

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	17 458,73	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	186 003,35	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	45 928,95	10 Kultúrna pamiatk.	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	112 485,52	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	1 723,01			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	363 599,56	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		363 599,56
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 363 599,56		72 719,91
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>436 319,47</b>
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa		0,00
				27 Kľzavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -		0,00

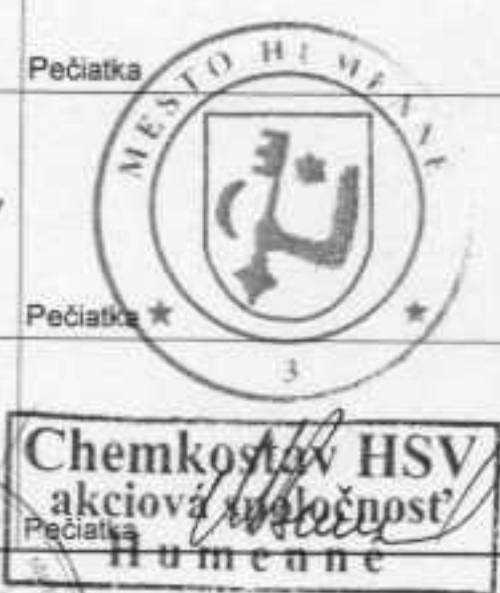

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Názov stavby

Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

JKSO

Názov objektu

SO 01 Hala

EČO

Miesto

Humenné

Objednávateľ

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

IČO

IČ DPH

Projektant

WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov

Zhotoviteľ

Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

36 473 332

202 002 5227

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa


Zdena Čelovská

29.04.2011

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	12 645,37	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00	
2	Montáž	163 261,14	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	
3	PSV Dodávky	42 647,54	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	
4	Montáž	108 140,45	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	
6	Montáž	1 723,01			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	328 417,51	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 328417,51			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			
				27 Kízavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

**Chemkostav HSV**  
akciová spoločnosť  
Humenné

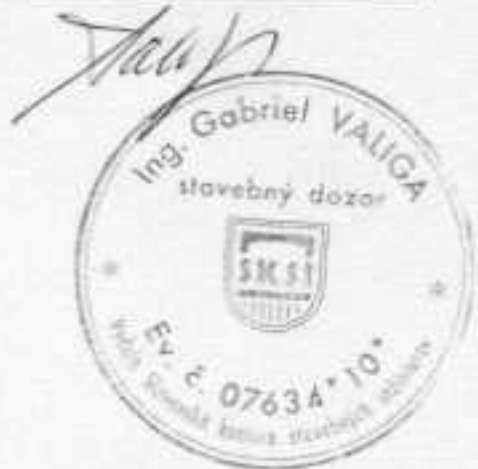

# Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 01 Hala

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	175 906,51	23 346,82	0,02	0,00	199 253,33
1	Zemné práce	13 212,12	1 314,69	0,01	0,00	14 526,81
2	Zakladanie	70 996,45	17 143,18	0,01	0,00	88 139,63
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	950,73	0,00	0,00	0,00	950,73
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	85 175,55	4 888,95	0,00	0,00	90 064,50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 571,66	0,00	0,00	0,00	5 571,66
PSV	Práce a dodávky PSV	150 787,99	0,00	0,00	0,00	150 787,99
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	33 358,14	0,00	0,00	0,00	33 358,14
762	Konštrukcie tesárske	2 215,73	0,00	0,00	0,00	2 215,73
764	Konštrukcie klampiarske	80 601,56	0,00	0,00	0,00	80 601,56
767	Konštrukcie doplnkové kovové	25 757,49	0,00	0,00	0,00	25 757,49
783	Dokončovacie práce - nátery	8 855,07	0,00	0,00	0,00	8 855,07
M	Práce a dodávky M	1 723,01	0,00	0,00	0,00	1 723,03
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	1 723,01	0,00	0,00	0,00	1 723,03
	<b>Celkom</b>	<b>328 417,51</b>	<b>23 346,82</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>351 764,35</b>

Chemkostav HSV  
akciová spoločnosť  
Humenné



*[Handwritten signatures]*



# Súpis vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 01 Hala

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## HSV Práce a dodávky HSV

175 906,51

2 007,855

23 346,82

### 1 Zemné práce

13 212,12

893,370

1 314,69

4	583	583371910 0	Štrkopiesok 0-32 B	m3	893,370	11,334	10 125,46	1,00000	893,370	116,00	1 314,69
6	001	171151102	Skúška podložia	m2	4,000	54,228	216,91	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	158,760	14,949	2 373,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	001	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 306,440	0,380	496,45	0,00000	0,000	0,00	0,00

### 2 Zakladanie

70 996,45

919,085

17 143,18

10	011	272321311	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	19,984	123,271	2 463,45	2,41829	48,327	79,94	9 853,91
11	011	272321312	Betón vystužený ocelovými vláknami tr. B30 hr. do 250mm	m3	359,271	172,310	61 905,99	2,41829	868,821	0,00	0,00
12	011	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	290,929	11,308	3 289,83	0,00073	0,213	290,93	3 289,84
13	011	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	436,395	1,975	861,88	0,00000	0,000	145,47	287,29
14	011	272361821	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	t	1,519	1 629,560	2 475,30	1,13444	1,723	2,28	3 712,14

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

950,73

4,404

0,00

17	011	311272019	Murivo nosné z tvárníc HEBEL HL 599x249x300 P3,3 500hr.300	m3	5,814	163,524	950,73	0,75740	4,404	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	----	-------	---------	--------	---------	-------	------	------

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

85 175,55

113,739

4 888,95

21	011	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	19,420	7,903	153,48	0,03036	0,590	618,62	4 888,95
22	011	620411125	Náter na vonkajšiu omietku epoxiesterovú farbou -z postaveného lešenia alebo z lešnárskej kliečky	m2	470,800	5,891	2 773,48	0,00070	0,330	0,00	0,00
23	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	470,800	8,925	4 201,89	0,04816	22,675	0,00	0,00
24	011	6224311601	Vonkajšia omietka stien šľachtená v soklovej oblasti	m2	97,440	15,798	1 539,36	0,02020	1,968	0,00	0,00
25	011	632451051	Priemyselná podlaha pre ťažkú prevádzku PANBEXF3,PANBEXIL	m2	1 306,440	11,121	14 528,92	0,02193	28,653	0,00	0,00

Chemkostav HSV  
akciová spoločnosť  
Humenné




Handwritten signature and date 29.4.2011.



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	011	632451055	Priemyselná podlaha pre ťažkú prevádzku CEMBEX U3,CEMBEX T3	m2	537,410	115,328	61 978,42	0,11076	59,525	0,00	0,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>5 571,66</b>		<b>77,257</b>		<b>0,00</b>
27	221	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	172,600	10,079	1 739,64	0,17638	30,444	0,00	0,00
28	592	0	Obrubník betónový	ks	346,000	5,059	1 750,41	0,04900	16,954	0,00	0,00
29	221	935112111	Osadenie priekop, žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	172,600	7,602	1 312,11	0,13691	23,631	0,00	0,00
30	592	0	Tvárnica 50x25x10	ks	346,000	2,224	769,50	0,01800	6,228	0,00	0,00
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>150 787,99</b>		<b>78,522</b>		<b>0,00</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>33 358,14</b>		<b>8,450</b>		<b>0,00</b>
41	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	654,760	1,685	1 103,27	0,00000	0,000	0,00	0,00
42		111631540	Náter SIKKATON B	l	0,655	2 987,500	1 956,81	1,00000	0,655	0,00	0,00
43	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná	M2	1 347,590	5,394	7 268,90	0,00000	0,000	0,00	0,00
44		628322850	Hydroizolácia FATRAFOL	m2	1 549,729	8,916	13 817,38	0,00443	6,865	0,00	0,00
45	711	711462202	Stierková hydroizolácia 2KS so zapracovanou textilnou mriežkou, Hlbkový základ LF, pruž. lep. malta	M2	46,220	19,710	911,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
46	711	711491171	Izolácia z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	M2	1 347,590	1,210	1 630,58	0,00000	0,000	0,00	0,00
47		693665140	Geotextília 300	m2	1 549,729	1,436	2 225,41	0,00030	0,465	0,00	0,00
48	711	711491172	Izolácia z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	M2	1 347,590	1,469	1 979,61	0,00000	0,000	0,00	0,00
49		693665100	Geotextília 300	m2	1 549,729	1,436	2 225,41	0,00030	0,465	0,00	0,00
50	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	8,446	28,389	239,77	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>2 215,73</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
51	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	75,000	4,979	373,43	0,00000	0,000	0,00	0,00
52		605150100	Hranolček 75/100	m3	0,619	183,924	113,85	0,00000	0,000	0,00	0,00
53	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	M	123,500	6,133	757,43	0,00000	0,000	0,00	0,00
54		605153000	Rezivo	m3	2,445	236,866	579,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
55	762	762341210	Montáž debriente a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	66,500	2,772	184,34	0,00000	0,000	0,00	0,00
56		605101350	Dosky a ľoše hr 32mm	m3	0,935	221,972	207,54	0,00000	0,000	0,00	0,00

Chemkostav HSV  
akciová spoločnosť  
H u m e n s k e

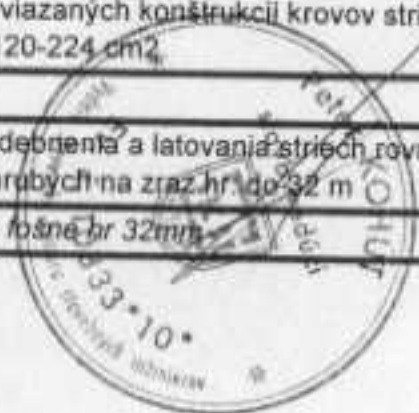

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**764 Konštrukcie klampiarske**

							80 601,56	65,288			
57	764	764311205	Krytiny z poplastovaného plechu RAN 40-B hr. 0,75	M2	2 244,891	19,000	42 652,93	0,01800	40,408	0,00	0,00
58	764	764311205	Krytiny z poplastovaného plechu RAN 40-B hr. 0,75	M2	947,441	19,000	18 001,38	0,01800	17,054	0,00	0,00
59	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl so sklonom do 30° 0,00732t	M2	659,700	0,970	639,91	0,00000	0,000	0,00	0,00
60	764	764321220	Oplechovanie z poplast. plechu rohov, kútov a rš 500 mm	M	518,300	10,260	5 317,76	0,00526	2,726	0,00	0,00
61	764	764321230	Oplechovanie hrebeňov z poplastovaného plechu s tesnením rš 600 mm	M	118,690	13,720	1 628,43	0,00528	0,627	0,00	0,00
62	764	764322221	Oplechovanie pod odkvapom, štítové lemovanie z poplastovaného plechu rš 330 mm	M	239,260	4,910	1 174,77	0,00500	1,196	0,00	0,00
63	764	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm 0,0032t	M	108,400	1,570	170,19	0,00000	0,000	0,00	0,00
64	764	764332260	Lemovanie stien z poplast. plechu s tesnením rš 660 mm	M	16,700	10,000	167,00	0,00852	0,142	0,00	0,00
65	764	764332261	Lemovanie strechy z poplast. plechu s tesnením rš 660 mm	M	46,000	12,050	554,30	0,00549	0,253	0,00	0,00
66	764	764341831	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30 st.,D do 250 mm 0,00305t	KUS	140,000	1,320	184,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
67	764	764351203	Žľaby z popl. plechu, pododkvapové polkruhové rš 330 mm	M	93,900	9,850	924,92	0,00785	0,737	0,00	0,00
68	764	764351207	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové štvorhranné rš 500 mm	M	114,660	14,400	1 651,10	0,00885	1,015	0,00	0,00
69	764	764359222	Kotlík žľabový	ks	12,000	10,940	131,28	0,00236	0,028	0,00	0,00
70	764	764410220	Oplechovanie parapetov z popl. plechu rš 160 mm	M	194,000	15,370	2 981,78	0,00235	0,456	0,00	0,00
71	764	764410250	Oplechovanie soklových panelov poplas. plech rš 330 mm	M	129,800	10,109	1 312,15	0,00325	0,422	0,00	0,00
72	764	764454212	Odpadové rúry z poplastovaného plechu pr.100mm	m	69,000	15,890	1 096,41	0,00325	0,224	0,00	0,00
73	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	T	65,244	30,845	2 012,45	0,00000	0,000	0,00	0,00

**767 Konštrukcie doplnkové kovové**

							25 757,49	4,784			
74	767	767312564	Dodávka a montáž presvetl. otvorov zaskl. polykarb. platňami	ks	22,000	77,900	1 713,80	0,12300	2,706	0,00	0,00
75	767	767657210	Montáž vrát rolovacích z dielov, s plochou do 6 m2	KUS	2,000	217,080	434,16	0,00000	0,000	0,00	0,00
76	767	767657230	Montáž vrát rolovacích z dielov, s plochou 9-13 m2	KUS	2,000	291,600	583,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
77	767	767657240	Montáž vrát rolovacích z dielov s plochou nad 13 m2	KUS	4,000	342,720	1 370,88	0,00000	0,000	0,00	0,00
78		553448740	Vráta priemyselné rolovacie svetlosť 3,5x4,2m, nezateplené automatické	kus	4,000	3 172,000	12 688,00	0,34700	1,388	0,00	0,00
79		553448720	Vráta priemyselné rolovacie svetlosť 3,4x3,6, nezateplené automatické	kus	2,000	2 597,000	5 194,00	0,19500	0,390	0,00	0,00
		553448590	Vráta priemyselné rolovacie svetlosť 2x2,5, nezateplené automatické	kus	2,000	1 820,000	3 640,00	0,15000	0,300	0,00	0,00

**Členkosť HSY**  
akciová spoločnosť  
H u m e n e





P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	4,783	27,900	133,45	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>8 855,07</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
82	783	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné	M2	2 014,805	1,662	3 348,61	0,00000	0,000	0,00	0,00
83	783	783122510	Nátery oceľ.konstr. finálny dvojnás.	M2	2 014,805	2,733	5 506,46	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>1 723,01</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
<b>24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.</b>							<b>1 723,01</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
86	924	2400110001	Vetrační otvor 600x600mm s integr. protidažď. žalúziou a mriežkou	KUS	10,000	135,324	1 353,24	0,00000	0,000	0,00	0,00
87	924	2400110002	Vetrační otvor D=200mm s integr. protidažď. žalúziou a mriežkou	KUS	4,000	92,448	369,77	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>							<b>328 417,51</b>		<b>2 086,378</b>		<b>23 346,82</b>

Chemkostav HSY  
akciová spoločnosť  
H. Hrabecová



*Handwritten signature*



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Názov stavby

Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom

JKSO

Názov objektu

SO 02 Administratívna budova

EČO

Miesto

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Humenné, Kukoreliho 34, Humenné

Projektant

WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov

Zhotoviteľ

Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Zdena Čelovská

29.04.2011

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	806,14	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	2 671,54	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	2 434,11	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	5 911,79	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				5 911,79
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5911,79				1 182,36
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				7 094,15
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00



**Chemkostav HSV**  
 Právná spoločnosť  
 Humenné



# Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 02 Administratívna budova

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	806,14	0,00	0,00	0,00	806,14
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	806,14	0,00	0,00	0,00	806,14
PSV	Práce a dodávky PSV	5 105,65	0,00	0,00	0,00	5 105,65
771	Podlahy z dlaždíc	757,59	0,00	0,00	0,00	757,59
781	Obklady z obkladačiek a dosiek	4 348,06	0,00	0,00	0,00	4 348,06
	<u>Celkom</u>	<u>5 911,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 911,79</u>

Chemkostav HSV  
akciová spoločnosť  
Humenné



*[Handwritten signature]*



# Súpis vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 02 Administratívna budova

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>806,14</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>806,14</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
24	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	453,140	1,779	806,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>5 105,65</b>		<b>3,173</b>		<b>0,00</b>
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>757,59</b>		<b>0,488</b>		<b>0,00</b>
85	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	20,950	11,865	248,57	0,00491	0,103	0,00	0,00
86		585820006	Lepiaca hmota	m2	21,369	1,534	32,78	0,00000	0,000	0,00	0,00
87		585820007	Špárovacia hmota	m2	21,369	0,702	15,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
88	597	0	Dlažba keramická	m2	21,369	20,153	430,65	0,01800	0,385	0,00	0,00
89	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,182	168,061	30,59	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>781 Obklady z obkladačiek a dosiek</b>							<b>4 348,06</b>		<b>2,685</b>		<b>0,00</b>
96	771	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 200x200mm	m2	116,500	17,636	2 054,59	0,00255	0,297	0,00	0,00
97		585820006	Lepiaca hmota	m2	116,500	1,534	178,71	0,00000	0,000	0,00	0,00
98		585820007	Špárovacia hmota	m2	116,500	0,702	81,78	0,00000	0,000	0,00	0,00
99	597	0	Obklad keramický	m2	116,500	16,589	1 932,62	0,02050	2,388	0,00	0,00
100	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,098	1 024,035	100,36	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>							<b>15 911,79</b>		<b>3,173</b>		<b>0,00</b>

Chemkostav HSV  
akciová spoločnosť  
Humenné



*[Handwritten signature]*



# KRYCI LIST ČERPANIA

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Názov stavby: **Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom**

Názov objektu: **SO 03 Mostová váha**

JKSO

EČO

Miesto

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Humenné, Kukoreliho 34, Humenné**

Projektant: **WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov**

Zhotoviteľ: **Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné**

Rozpočet číslo

Spracoval


Dňa

**Zdena Čelovská**

**29.04.2011**

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	242,38	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	10 976,06	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	11 218,44	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				11 218,44
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 11218,44				2 243,69
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>13 462,13</b>
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00



# Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 03 Mostová váha

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	11 218,44	0,00	0,00	0,00	11 218,44
1	Zemné práce	2 976,62	0,00	0,00	0,00	2 976,62
2	Zakladanie	5 128,33	0,00	0,00	0,00	5 128,33
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 113,49	0,00	0,00	0,00	3 113,49
	<u>Celkom</u>	<u>11 218,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 218,44</u>

Chemkostav HSV  
akciová spoločnosť  
Humenné



*[Handwritten signature]*



# Súpis vykonaných prác

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Stavba: Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 03 Mostová váha

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné


Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

JKSO:

Miesto: Humenné

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>11 218,44</b>		<b>17,618</b>		<b>0,00</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>2 976,62</b>		<b>15,200</b>		<b>0,00</b>
1	221	113107125	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400-500mm, 0,720 t	m2	76,000	24,912	1 893,31	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	76,000	3,441	261,52	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	221	113107149	Priplatok za každých ďalších 50 mm hrubky 0,135t	m2	76,000	3,439	261,36	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	583	0	Štrkopiesok 0-32 B	t	15,200	15,946	242,38	1,00000	15,200	0,00	0,00
5	001	171151102	Skúška podložia	m2	1,000	95,793	95,79	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,500	19,327	222,26	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>2 Zakladanie</b>							<b>5 128,33</b>		<b>2,418</b>		<b>0,00</b>
7	011	272321311	Stavba - Zapustená mostová váha SP 6018	ks	1,000	5 128,329	5 128,33	2,41829	2,418	0,00	0,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>3 113,49</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	62,168	11,689	726,68	0,00000	0,000	0,00	0,00
14	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	62,168	7,428	461,78	0,00000	0,000	0,00	0,00
15	013	979082112	Poplatok za skládku	t	62,168	30,965	1 925,03	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>							<b>11 218,44</b>		<b>17,618</b>		<b>0,00</b>



*Handwritten signature*



# KRYCI LIST ČERPANIA

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Názov stavby

Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

JKSO

Názov objektu

SO 04 Spevnené plochy a manipulačné plochy

EČO

Miesto

Humenné

Objednávateľ

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Projektant

WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov

Zhotoviteľ

Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

IČO

IČ DPH

36 473 332

202 002 5227

Rozpočet číslo

Spracoval


Dňa

Zdena Čelovská

29.04.2011

## Náklady čerpania v EUR

A		B		C		D	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
1	HSV Dodávky	4 418,03	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	9 628,45	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	14 046,48	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 14046,48			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				E			
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			
				27 Kľzavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			





# Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Snínskej ulici v Humennom

Objekt: SO 04 Spevnené plochy a manipulačné plochy

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné


Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	14 046,48	0,00	25 573,28	0,00	39 619,76
1	Zemné práce	6 209,09	0,00	20 125,92	0,00	26 335,02
2	Zakladanie	998,24	0,00	0,00	0,00	998,24
8	Rúrové vedenie	2 857,39	0,00	0,00	0,00	2 857,39
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 695,34	0,00	0,00	0,00	3 695,34
99	Presun hmôt HSV	224,39	0,00	5 447,36	0,00	5 671,75
4	Vodorovné konštrukcie	62,03	0,00	0,00	0,00	62,02
	<b>Celkom</b>	<b>14 046,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25 573,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39 619,76</b>

**Chemkostav HSV**  
akciová spoločnosť  
Humenné

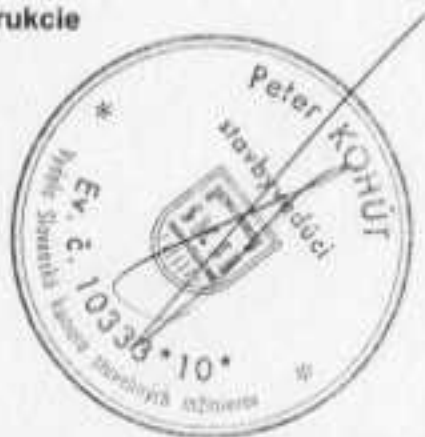

# Súpis vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 04 Spevnené plochy a manipulačné plochy

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							14 046,48		111,638		0,00
1 Zemné práce							6 209,09		19,600		0,00
5	001	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	527,530	1,868	985,43	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	158,259	0,855	135,31	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	22,340	11,038	246,59	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	6,702	5,645	37,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	17,640	7,231	127,55	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,292	0,718	3,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	17,700	3,826	67,72	0,00000	0,000	0,00	0,00
14	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	527,530	2,660	1 403,23	0,00000	0,000	0,00	0,00
15	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	5 071,419	0,250	1 267,85	0,00000	0,000	0,00	0,00
16	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	17,700	2,038	36,07	0,00000	0,000	0,00	0,00
17	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	238,933	2,355	562,69	0,00000	0,000	0,00	0,00
18	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	533,115	0,950	506,46	0,00000	0,000	0,00	0,00
19	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,717	3,052	47,97	0,00000	0,000	0,00	0,00
20	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,600	11,786	231,01	0,00000	0,000	0,00	0,00
21	583	0	Štrkopiesok 0-32 Z	M3	19,600	12,231	239,73	1,00000	19,600	0,00	0,00
24	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 14 so zhutnením	m2	632,060	0,462	292,01	0,00000	0,000	0,00	0,00
25	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	17,701	1,008	17,84	0,00000	0,000	0,00	0,00

2 Zakladanie  
**Chemkostav HSV**  
 akciová spoločnosť  
 Humenné



35,210  
*[Handwritten signature]*



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestávané [MJ]	Prestávané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	002	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	8,936	30,685	274,20	1,92050	17,162	0,00	0,00
27	271	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	111,700	6,482	724,04	0,16158	18,048	0,00	0,00

**8 Rúrové vedenie**

**2 857,39**

**7,378**

**0,00**

38	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	5,000	49,446	247,23	0,34308	1,715	0,00	0,00
39	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	24,979	99,92	0,00702	0,028	0,00	0,00
40	552	0	Poklop VS tupná šachta D 600 D	ks	4,000	225,611	902,44	0,15800	0,632	0,00	0,00
41	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	5,000	28,704	143,52	0,01170	0,059	0,00	0,00
42	552	0	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	5,000	204,976	1 024,88	0,17000	0,850	0,00	0,00
43	592	0	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50	ks	5,000	14,472	72,36	0,17500	0,875	0,00	0,00
44	592	0	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50	ks	5,000	14,708	73,54	0,17000	0,850	0,00	0,00
46	592	0	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 11-50	ks	5,000	10,301	51,51	0,12000	0,600	0,00	0,00
47	592	0	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66	ks	5,000	19,064	95,32	0,09900	0,495	0,00	0,00
48	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	4,000	36,668	146,67	0,31844	1,274	0,00	0,00

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**3 695,34**

**49,070**

**0,00**

49	221	918561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	32,000	6,036	193,15	0,10562	3,380	0,00	0,00
50	592	0	Obrubník betónový ABO 4-8	ks	32,320	4,587	148,25	0,04100	1,325	0,00	0,00
51	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	190,000	8,126	1 543,94	0,13553	25,751	0,00	0,00
52	592	0	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	191,900	9,432	1 810,00	0,09700	18,614	0,00	0,00

**99 Presun hmôt HSV**

**224,39**

**0,000**

**0,00**

61	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	111,639	2,010	224,39	0,00000	0,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	--------	---------	-------	------	------

**4 Vodorovné konštrukcie**

**62,03**

**0,381**

**0,00**

28	271	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	4,000	15,506	62,03	0,09528	0,381	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	-------	---------	-------	------	------

**Chemkostav HSV**  
akciová spoločnosť  
Húľčince



*Handwritten signature*



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Názov stavby: **Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom**

JKSO

Názov objektu: **SO 09 - Oplotenie**

EČO

Miesto

Humenné

Objednávateľ: **Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné**

IČO

IČ DPH

Projektant: **WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov**

Zhotoviteľ: **Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné**

36 473 332

202 002 5227

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Zdena Čelovská

29.04.2011

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	152,95	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	1 331,56	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	609,87	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	1 910,96	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	4 005,34	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				4 005,34
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 4005,34				801,07
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>4 806,41</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>				
<b>Zhotoviteľ</b>				26 Dodávky objednávateľa				0,00
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00



# Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 09 - Oplotenie

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

JKSO:

Miesto: Humenné

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	1 484,51	0,00	4 464,65	0,00	5 949,14
1	Zemné práce	231,79	0,00	695,37	0,00	927,15
2	Zakladanie	823,01	0,00	2 469,04	0,00	3 292,05
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	283,32	0,00	861,10	0,00	1 144,42
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	146,39	0,00	439,14	0,00	585,52
PSV	Práce a dodávky PSV	2 520,83	0,00	7 564,34	0,00	10 085,19
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 380,99	0,00	4 144,82	0,00	5 525,83
783	Dokončovacie práce - nátery	1 139,84	0,00	3 419,52	0,00	4 559,36
	<u>Celkom</u>	<u>4 005,34</u>	<u>0,00</u>	<u>12 028,99</u>	<u>0,00</u>	<u>16 034,33</u>

Chemkostav HSV  
akciová spoločnosť  
Humenné



# Súpis vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 09 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 10.3.-28.4.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 29.4.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 484,51</b>		<b>16,285</b>		<b>0,00</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>231,79</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
1	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	6,544	29,208	191,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	001	133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	1,963	4,140	8,13	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,544	1,695	11,09	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	2,530	0,929	2,35	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach	m3	14,250	1,339	19,08	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>2 Zakladanie</b>							<b>823,01</b>		<b>15,832</b>		<b>0,00</b>
6	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.B 20 /C 16/20/	m3	6,544	125,766	823,01	2,41932	15,832	0,00	0,00
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>283,32</b>		<b>0,453</b>		<b>0,00</b>
7	015	338171111	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zaliatím cement, maltou	ks	8,000	4,611	36,89	0,00468	0,037	0,00	0,00
8	015	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m zaliatím cem.mal.	ks	19,000	4,920	93,48	0,00702	0,133	0,00	0,00
9	553	0	Stĺpik z oceľovej rúrky DN 51/4, dl. 1800 mm	ks	8,000	4,320	34,56	0,00910	0,073	0,00	0,00
10	553	0	Stĺpik z oceľovej rúrky DN 51/4, dl.2550 mm	ks	19,000	6,231	118,39	0,01100	0,209	0,00	0,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>146,39</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
11	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2,200 t	m3	2,000	64,833	129,67	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	321	979082312	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia, s vyložením na vzdialenosť do 1000 m	t	5,000	2,989	14,95	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	321	979082319	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	10,000	0,177	1,77	0,00000	0,000	0,00	0,00

**PSV Práce a dodávky PSV**

**Chemkostav HSV**  
akciová spoločnosť  
Humenné



*[Handwritten signature]*



